

Зачем это нужно?


- о Высокая конкуренция на рынке труда
- Основной отсев на стадии просмотра резюме
- Первый бастион это HR






Актуальность проблемы

- о Мало кто может самостоятельно составить грамотное резюме
- Большинство онлайн-сервисов имеют громоздкий,
 избыточный и неэстетичный интерфейс
- Конструкторы резюме имеют общую направленность





Команда проекта


- **У** Рожков Евгений Александрович − WEB-разработчик
- ✓ **Мереха Евгений Владимирович** Enterprise Javaразработчик.
- У Рубанский Павел Сергеевич − Бизнес-аналитик.
- ✓ Туманов Максим Евгеньевич Администратор базы данных, DevOps-инженер.




Разработка плана работы

- Распределение ролей в команде
- Определение задач каждой роли
- Декомпозиция задач
- Составление взаимосвязей между подзадачами
- Определение связей предшествования
- Календарное планирование






Структура реализации проекта

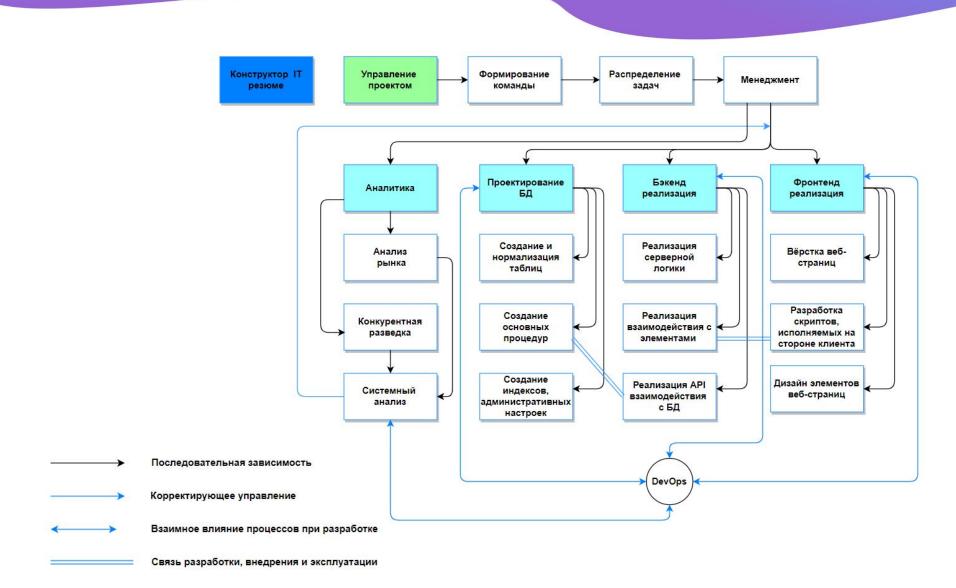

Структура проекта

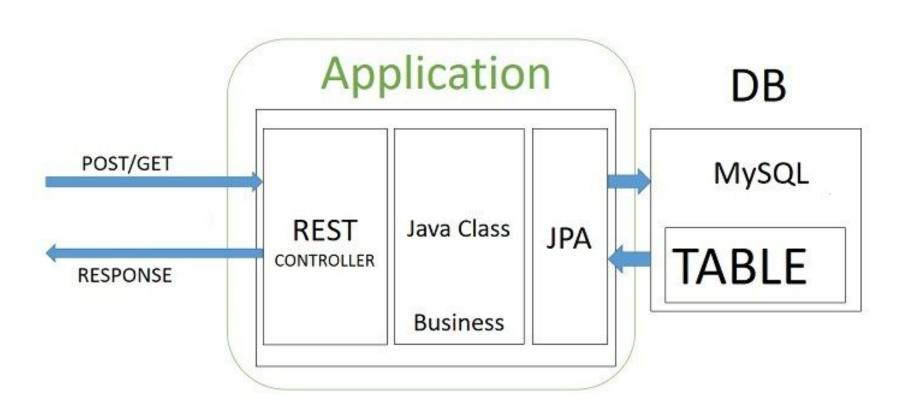

Определение сроков

Исполнитель	Задача	Начало	Окончание	Дней	Часов
Мереха, Рожков	Формирование идеи проекта	11.02.2021	12.02.2021	1	
Команда	Формирование команды	13.02.2021	17.02.2021	4	
Команда	Распределение ролей	17.02.2021	24.02.2021	7	
Команда	Утверждение темы	25.02.2021	26.02.2021	1	
Туманов	Проектирование базы данных	25.02.2021	28.02.2021	3	24
Рубанский	Анализ рынка	25.02.2021	28.02.2021	3	24
Рубанский	Конкурентная разведка	28.02.2021	12.03.2021	12	96
Туманов, Мереха, Рожков	Выбор стека технологий	27.02.2021	28.02.2021	1	8
Мереха	Реализация АРІ взаимодействия с БД	28.02.2021	07.03.2021	7	56
Туманов	DevOps-сопровождение разработки	28.02.2021	23.03.2021	23	184
Мереха	Методы обработки пользовательских запросов	08.03.2021	15.03.2021	7	56
Рожков	AJAX	12.03.2021	16.03.2021	4	32
Рожков	Создание пользовательского веб- интерфейса	28.02.2021	10.03.2021	10	80
Рожков	Дизайн веб-интерфейса	10.03.2021	22.03.2021	12	96
Рубанский	Системный анализ	28.02.2021	23.03.2021	23	184
Мереха	Основное приложение	16.03.2021	22.03.2021	6	48
Рожков	Юзер-сайд скрипты	10.03.2021	21.03.2021	11	88
Туманов	Администрирование БД	22.03.2021	27.03.2021	5	40
Команда	Публичная защита	24.03.2021	25.03.2021	1	

Диаграмма Ганта


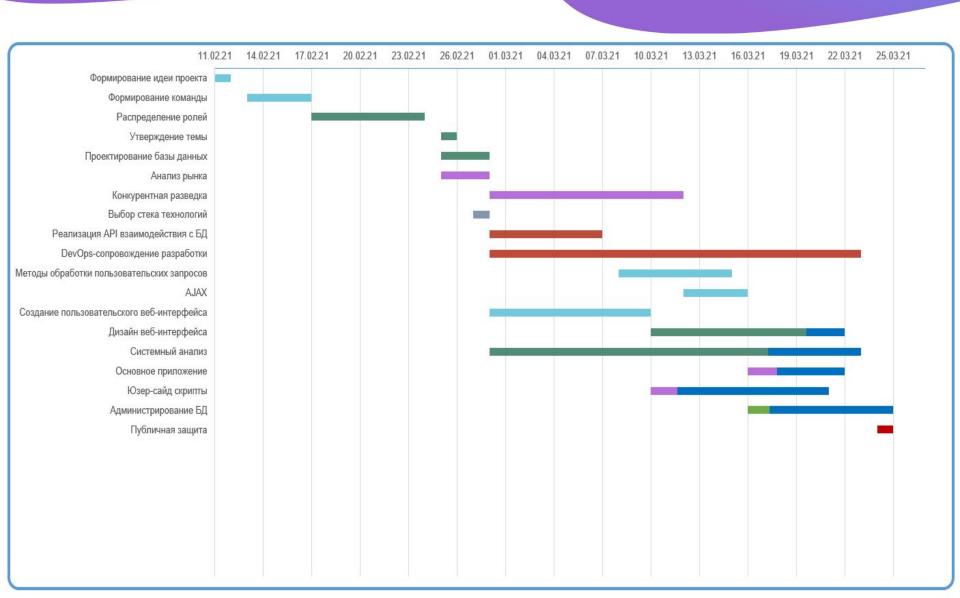


Диаграмма предшествования

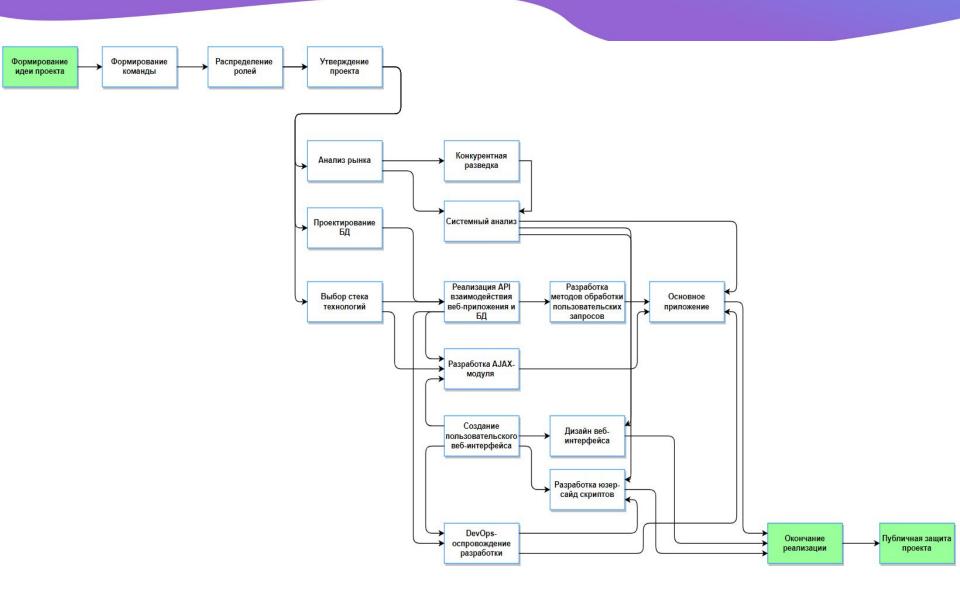

Обоснованность бюджета

Составляющие оценки минимального бюджета:

- Общее число дней работы: 1 месяц(точнее для каждого в таблице сроков)
- Количество часов работы специалиста в день: 8 часов
- Ставка (руб./час): 750р Backend-разработчик, 450р WEB-разработчик, 120р Аналитик, 420р DevOps-инженер.
- Светлое, просторное и удобное помещение для совместной работы:

7500р/месяц на человека.

- Аренда выделенного сервера для веб-приложения.
- Готовый продукт нужно продвигать.



Бюджет проекта

Наименование	Количество	Стоимость (руб.)			
Расходы на разработку					
Работа бэкенд-программиста	1684	126000p			
Работа веб-программиста	3044	136800p			
Работа аналитика	3044	36480p			
Работа DevOps-инженера	2564	107520p			
Итс	Итого				
	Техническая поддержка				
Аренда сервера	1 месяц	5000p			
Аренда почтового сервера	1 месяц	4000p			
Аренда дискового пространства	1 месяц	7000p			
Ито	16000p				
Дополнительные траты					
Рабочее место	4 резидента/1 месяц	30000p			
Продвижение продукта	1 месяц	120000p			
Итс	Итого				
Отого	Итого всего				


Ресурсы проекта

Ресурс	Описание	Срок				
Трудовые ресурсы						
Руководство	Децентрализовано	25.02-25.03				
Аналитик	Рубанский П.С.	25.02-25.03				
Разработчики	Мереха Е.В., Туманов М.Е., Рожков Е.А.	25.02-25.03				
Администратор	Туманов М.Е.	25.02				
Дизайнер	Рожков Е.А.	25.02-25.03				
Материальные ресурсы						
Рабочий офис	Комната на 4 человек в коворкинг-центре	25.02-25.03 с продлением				
Серверы	Арендованный VDS + почтовый сервер + облачное хранилище	25.02-25.03 с продлением				

Экспертная оценка рисков

Факторы риска	Угрозы	Мероприятия по снижению риска			
Технические риски					
Ошибочный выбор стека технологий для реализации проекта	Возникновение сложностей при разработке	Сравнение нескольких стеков технологий, выбор оптимального и обоснование выбора			
Нехватка вычислительной мощности сервера	Падение быстродействия	Рассчет возможного максимального и минимального трафика и подбор подходящей конфигурации сервера			
Финансовые риски					
Задержка разработки проекта	Ежемесячные расходы при задержке проекта приведут к переплате	Расписание проекта, определение сроков этапов разработки проекта, выбор компитентных разработчиков			
Организационные риски					
Недостаточная поддержка со стороны руководства заказчика	Увеличение сроков исполнения работ	Выделение ответственного, контролирующего сроки и качество работ			
	Форс-мажорные риски				
Атака на сервер	Утеря БД	Регулярные бэкапы			


Веб-интерфейс конструктора

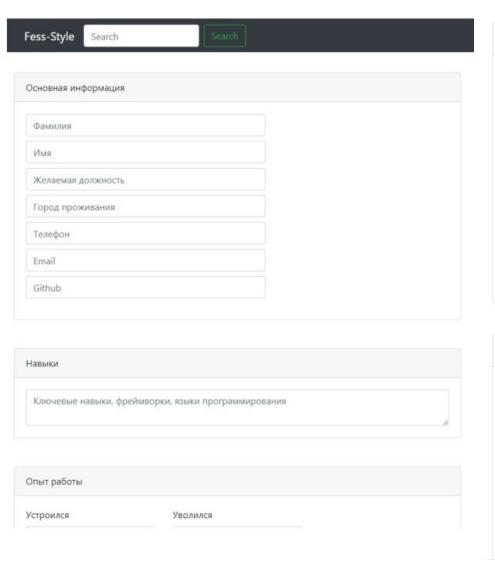

Устроился	Уволился	
12.12.2012	12.12.2020	
Админ паблика Вкон	нтакте	
Vk.com		
Работал админом		
Удалить		
Удалить Добавить		

Образование					
НГТУ					
АВТФ					
Специальность					
Год начала обучения	2016	\$	Год окончания обучения	2021	•
Удалить					
Добавить					

Веб-интерфейс конструктора



ополнительная информация		
Я топовый		

Создать резюме

Результат работы онлайн-конструктора



Павел Рубанский

Директор google

Новосибирск, Россия

Телефон: +7 (777) 77-7777

Email: asd@mail.ru

НАВЫКИ

Составление топовых презентаций

ОПЫТ РАБОТЫ

2012.12.12 - 2020.12.12

Vk.com - Админ паблика Вконтакте Работал админом

ОБРАЗОВАНИЕ

2016 - 2021

НГТУ

ΑΒΤΦ

Автоматика и вычислительная техника

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- -Русский
- -English (Beginner)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Я топовый

Благодарим за внимание





